①週休2日確保工事（フロー1）

（１）対象工事の選定～契約締結

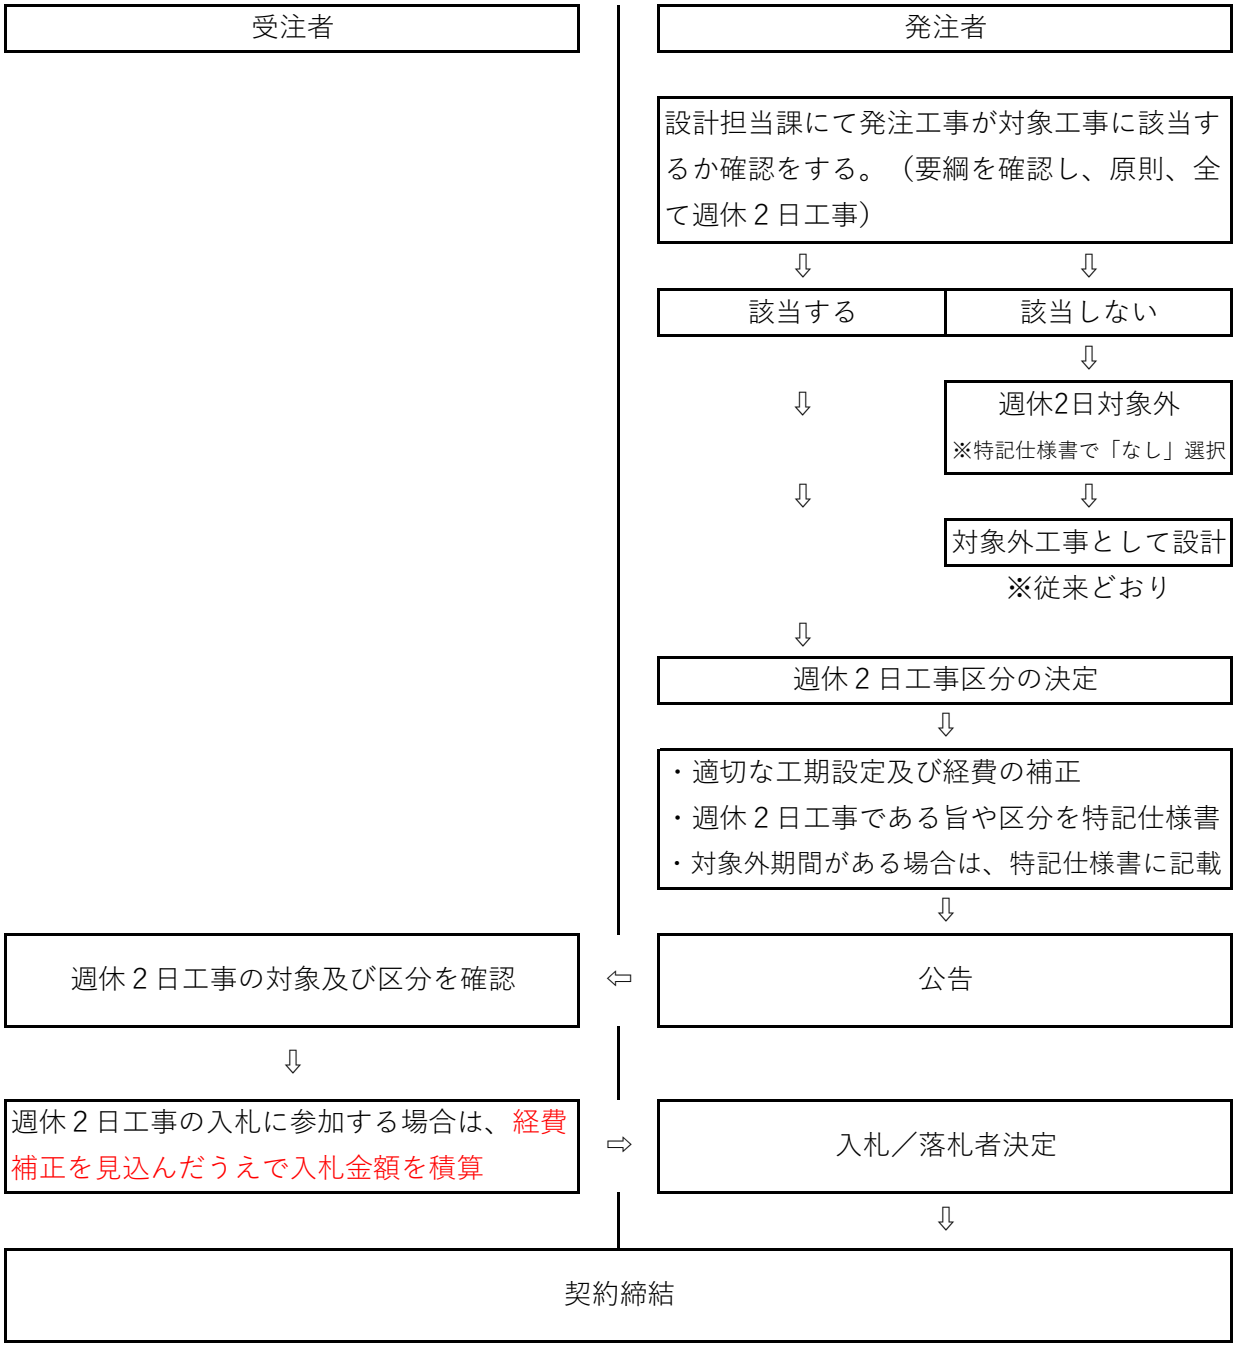

（２）関係書類の提出～工事着手（週休２日工事の実施に関する協議）

受注者		発注者
請負工事契約書を取り交わし後、工事打合簿（協議）を提出（下記①～④を選択し、報告する。※④の場合は理由も明記）	⇨	提出書類の内容確認
①完全週休2日(土日)（全ての週で土日閉所） ②月単位の週休2日（全ての月で4週8休以上） ③通期の週休2日（工期全体で4週8休以上） ④週休2日を行わない ※①～③は対象期間内　※当初設計は ①で計上		
⇩		
施工計画書提出時「現場閉所計画書」を添付 ※上記、選択を反映したもの	⇨	提出書類の内容確認
⇩		
工事着手	⇨	以後は、履行報告書で「現場閉所実施書」を確認　※月末締め、翌月始め提出分

（3）施工開始～竣工・竣工検査・評定

受注者		発注者
毎月の履行報告書に「現場閉所報告書」を添付し提出	⇨	提出書類の内容確認
⇩		
現場閉所予定日にやむをえず作業を行う場合には、監督職員へ報告		
⇩		
工事完成		
⇩		
「現場閉所報告書」で週休2日のどのパターンかを確認し、工事打合簿（協議）で補正を確定する。		
①完全週休2日(土日)（全ての週で土日閉所） ②月単位の週休2日（全ての月で4週8休以上） ③通期の週休2日（工期全体で4週8休以上） ④週休2日を行わない	⇨	工事打合簿（協議）で確定した補正に変更 ※当初設計は①で計上。

①または②	③	④
⇩	⇩	⇩
①労務1.02/共通1.02/現場1.03 ②労務1.02/共通1.01/現場1.02	1.0補正なし	1.0補正なし

変更内容の確認	⇦	
⇩		⇩
変更契約締結（総額／①以外は経費率減）		
⇩		⇩
竣 工 ・ 竣 工 検 査 ・ 評 定（達成状況に応じて加点又は減点）		

〇週休2日確保工事（パターン別）

【パターン1】完全週休2日（土日）

※会社方針で土日いずれかが休みではない場合等は、他の平日を指定して休日扱いにできる。

1.工期の中で、対象期間を設定。

2.対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。

〈対象期間R7年7～8月全ての場合を例〉

月	火	水	木	金	土	日
	7/1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

月	火	水	木	金	土	日
				8/1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
[illegible]	26	27	28	29	30	31

雨天休み

休み

雨天休みがあっても土日は休み

【パターン2】月単位の週休2日

1.工期の中で、対象期間を設定。

2.対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合が28.5%（8日/28日）以上の状態をいう。

3.暦上の土日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行う。

雨天休みもカウント

〈対象期間R7年7～8月全ての場合を例〉

月	火	水	木	金	土	日
	7/1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

・8日（閉所日数）÷31日＝25.8%　＜　28.5%

・8日（閉所日数）　≧　8日（土日）

月	火	水	木	金	土	日
				8/1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

・9日（閉所日数）÷31日＝29.0%　＞　28.5%

雨天休み

休み

【パターン3】通期の週休2日

1.工期の中で、対象期間を設定。

2.対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日/28日）以上の状態をいう。（雨天休みもカウント）
